

審判システム刷新プロジェクトについて

2022年12月5日


審判システム刷新プロジェクト



プロジェクト概況

【全体スケジュール】

- (1) 審判基盤 (DB部分) : 詳細設計工程 (①情報提供向け)
 詳細設計工程 (②刷新審判向け)
- (2) 刷新審判 (AP部分) : 詳細設計工程 (当初スケジュールから基本設計が遅延したため、
 リカバリプランに基づきプロジェクトを推進)

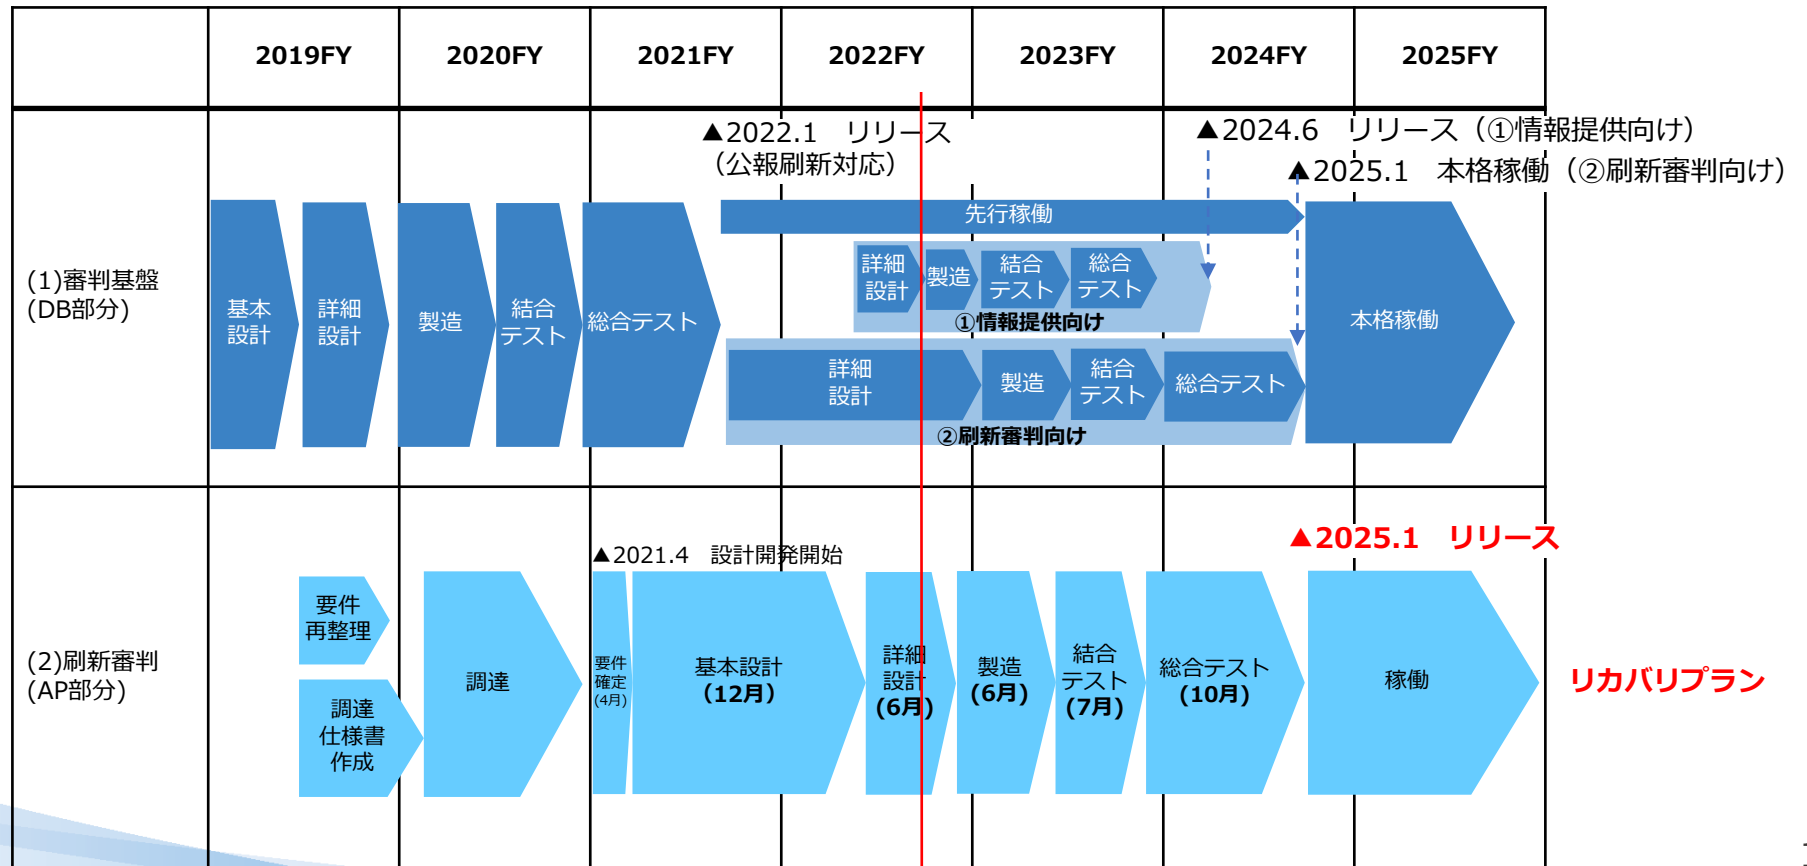

プロジェクト概況

1. 審判基盤、刷新審判ともにスケジュールに沿ってプロジェクトを推進中。特に、刷新審判の詳細設計工程について、これまでのところ、各マイルストーン（個別設計開始、システムスルー検証開始、アーキ監査開始）を達成できている状況。
2. 刷新審判において、基本設計工程にて課題となった進捗管理や体制について、詳細設計工程計画時に対策を講じた結果、改善が見られている。
3. 刷新審判において、今後も、継続的に改善していくことが重要。現在、進捗管理における定量評価の改善について、次工程に向けて準備を進めている。
4. 審判基盤、刷新審判ともに、移行設計、結合試験や総合試験等、庁側の関与が重要となる工程が続く。ベンダと密に連携し、一体感を持ってプロジェクトを進めていく。
