

意商（V3）システム刷新プロジェクトについて

2024年11月27日

意商（V3）システム刷新プロジェクト



1

V3刷新プロジェクトの概況

2

詳細設計について


3

製造・単体テストの進捗状況

4

移行について

1.1 V3刷新プロジェクトの概況（V3システムについて）

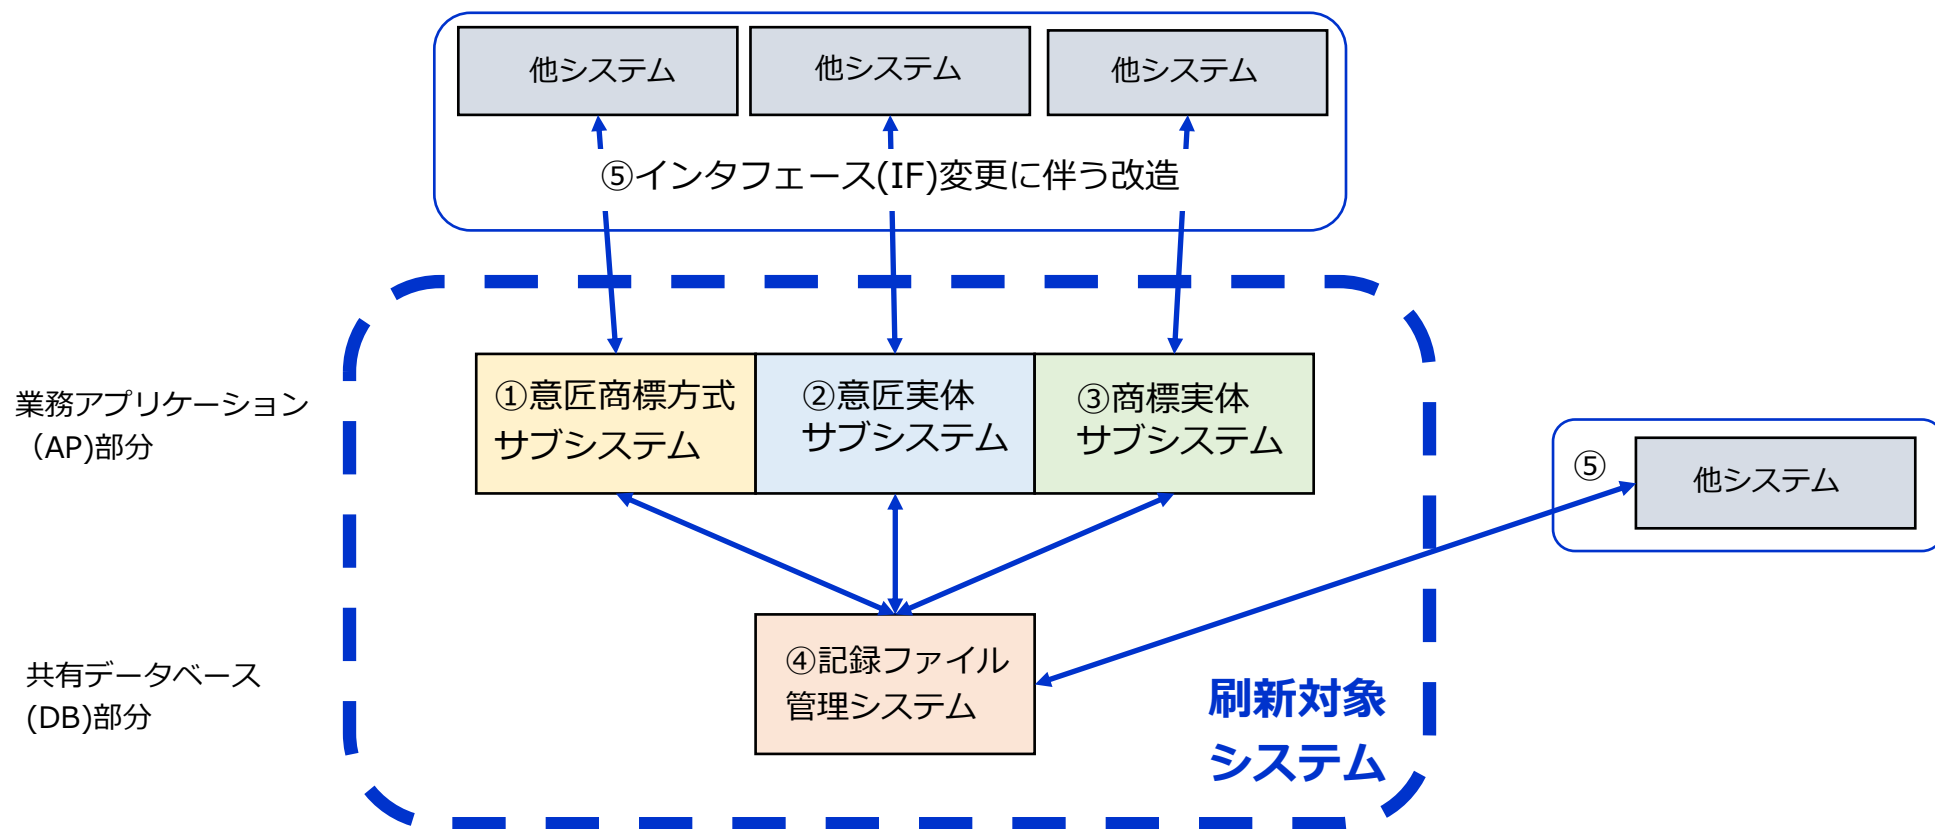

- ①意匠商標方式サブシステム：意匠・商標の方式審査を行う。
- ②意匠実体サブシステム：意匠の実体審査を行う。
- ③商標実体サブシステム：商標の実体審査を行う。
- ④記録ファイル管理システム：①～③が用いる共有データを保持する。
- ⑤他システム：①～④とインタフェース(IF)を持つシステム。

1.2 V3刷新プロジェクトの概況

- 業務AP：詳細設計を終え、2024年8月より製造・単体テストを実施中。
- 共有DB：2024年11月よりV3業務AP向け非標準IFの結合テストを実施中。
- ハードウェア(HW)：2024年7月よりHWの環境定義設計・構築を実施中。

V3刷新の開発スケジュール

年度		2022					2023										2024 現在												2025												2026											
月		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
業務AP	①意匠商標方式サブシステム ②意匠実体サブシステム ③商標実体サブシステム	開発前準備					要件確定	基本設計					詳細設計					製造・単体テスト					結合テスト												総合・受入テスト・移行																	
共有DB	④記録ファイル管理システム	標準IFの開発																																																		
HW	意匠商標審査・基盤サーバ																																																			

↑ V3業務APと導通

↑ 試験機納入

↑ 本番機納入
